

橋 梁 台 帳										橋 梁 整理番号	KR		03		新座市インフラ整備部道路河川課					
一 般 事 項				上 部 工	上 部 工 型 式			主 桁			横 桁			縦 桁			材 質		数 量	
ふりがな		い し が み			本数	桁 高	間隔	本数	桁 高	間隔	本数	桁 高	間隔	本数	桁 高	間隔	SS41			
橋 名		石 神 橋			単純支持桁橋			2	1.50	2.75	19									
路 線 名		市 道 第 7218 号 線			鋼桁橋															
所 在 地		起点側 石 神 三 丁 目 地 内 終点側 栗 原 一 丁 目 地 内																		
橋 格 (示方書等)		2 等橋 TL- 14 t (昭和 55 年 道・示) (1980 年 道・示)		支 承	路面位置 1.上路 ②中路 3.下路			型 式		数 量	伸 縮 継 手	型 式		数 量	舗 装 厚 (材料)	車道 cm ()		床 版 厚 ()	歩道 2.5 cm (アスファルト舗装)	
設計震度		Kh= 0.16 Kv= 0			耐震対策 1.移動制限 2.SE値 3.連結 4.その他			A1:支承板支承		2基		A1:カットオフジョイント		1						
橋下種別 (名 称)		1.河川 2.道路 3.鉄道 4.その他 (黒目川)			高欄形式 鉄骨 H=1.10m			A2:支承板支承		2基		A2:カットオフジョイント		1						
架設工法		トラッククレーンベント工法																		
桁下状況		桁下空間	4.5 m		材 料	鋼材	t	鉄筋	t	PC鋼材	t	コンクリート	m ³	特殊材料						
橋 長		32.74 m		下 部 工	下 部 工 型 式			基礎型式		基礎杭種類		基礎杭寸法		本数	下 部 工 材 料 計					
径 間 割		1 径間 32.06 m			A1:逆T式橋台			直接基礎							コンクリート m ³					
幅員構成 (側道橋) 有・(無)		歩道 + 路肩 + 車道 + 路肩 2.50 + + +			A2:逆T式橋台			直接基礎							鉄 筋 t (本)					
(上(下)線橋) 有・(無)		+ 中央帯 + 路肩 + 車道 + 路肩 + + + +													基 礎 杭 t					
		+ 歩道 = 有効幅員 + 2.50 m													PC鋼材 t					
															支持地盤		シルト混じり砂礫層			
橋 面 積		(橋長) (有効幅員) 32.74 × 2.50 = 81.9 m ²		請 負 (受託)者	設計委託				現場塗装面積	桁橋灯	m ²		高欄	m ²		河川占有許可	許 年 月	内 容	番 号	期 限 年 月
平面線形		1.直橋 2.斜橋 76° 3.曲線 (R= m)			上部工	東日本鉄工(株)			事業費	総事業費	千円 0 円/m ²		支 承	m ²		川				
最 急 縦断勾配		橋梁部	2.0 %		取付部	8.0 %			上部工費	千円 0 円/m ²				占						
施 工 年 月	詳細設計委託	S 年 月 月	～ S 年 月 月		下部工	東日本鉄工(株)			下部工費	千円 0 円/m ²				許						
	下部工事	S 年 月 月	～ S 年 月 月						その他	千円				可						
	上部工事	S 年 月 月	～ S 62 年 8 月																	

[illegible]

橋梁 整理番号	KR	03	橋梁名	石	神 橋
------------	----	----	-----	---	-----



橋梁
整理番号

KR

03


橋梁名

石

神 橋

平面図、側面図、断面図(一般図の縮小版でもよい)

石神橋一般図

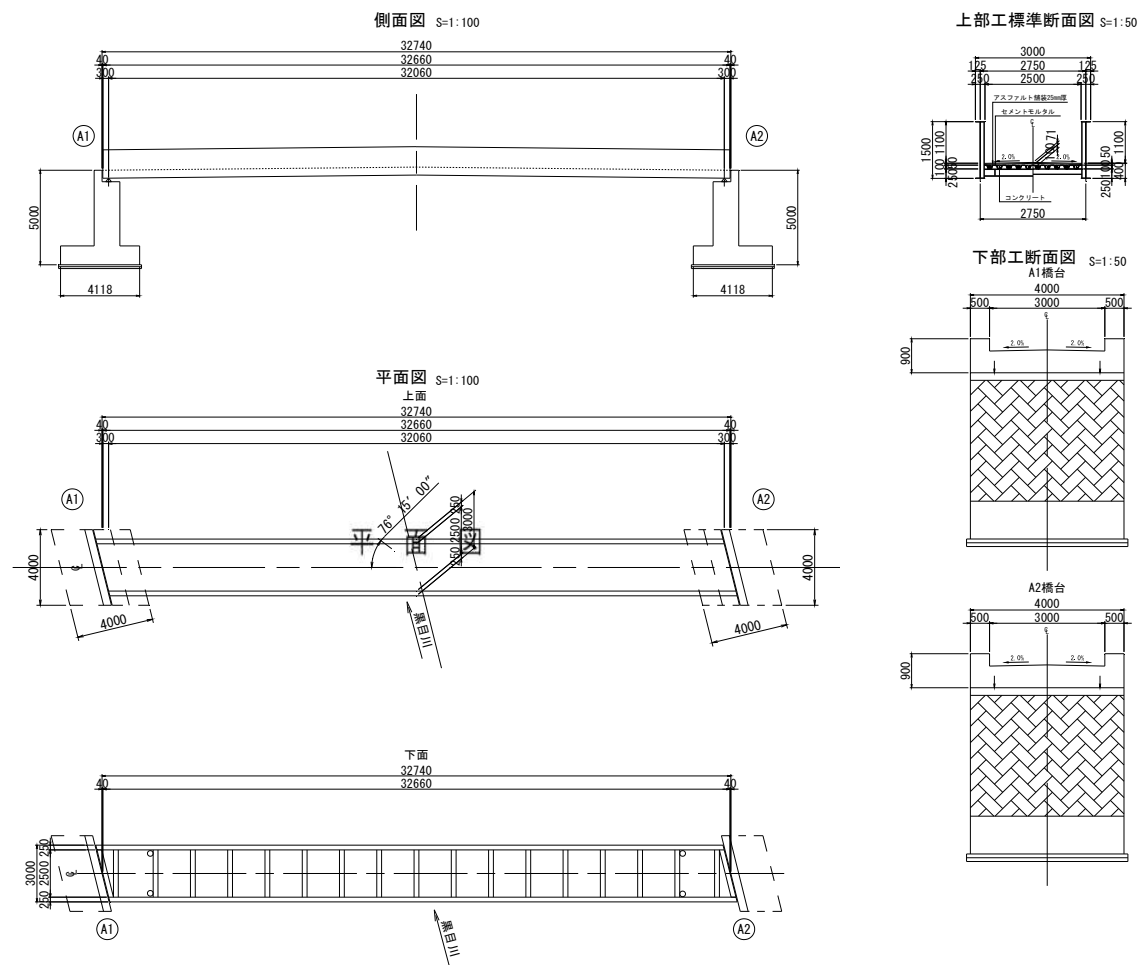

作成年月日 平成 27 年 12 月 18 日

新座市橋梁台帳 様式4号
